

**REPORTE PERIÓDICO
DICIEMBRE**

Acuerdo >

Capital



Calle Larrea

**Avenidas Aristóbulo del Valle,
J. J. Paso, 7 Jefes y Peñaloza**



Santa Fe
PROVINCIA

**Ministerio de
Obras Públicas**

**A 3 MESES DE SU
INAUGURACIÓN:**

**Hoy es una vía
central para miles
de santafesinos**



**Pavimentación de
Calle Larrea**



**Cordón
cuneta**



**Veredas
nuevas**



**Rampas
de acceso**




**Reductores
de velocidad**



55%

**de obra
avanzada**

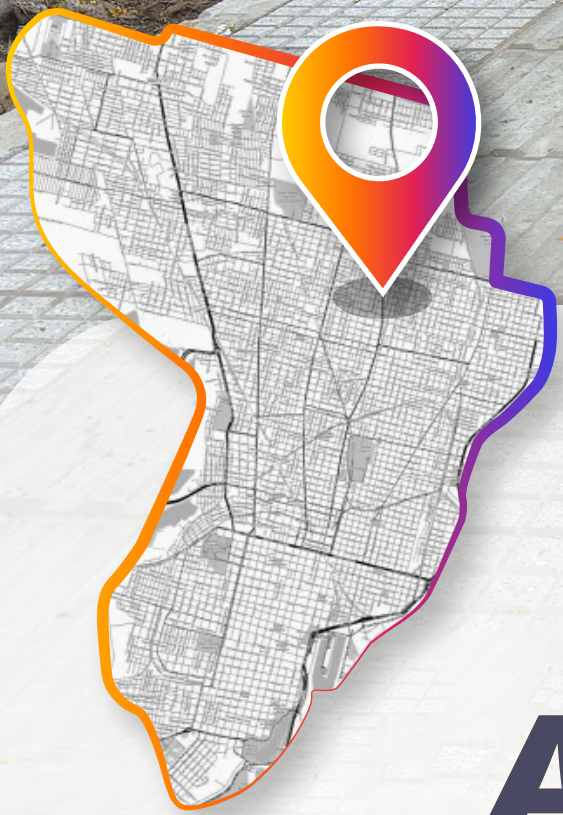


Cantero central de Av. Aristóbulo del Valle

Se ejecutaron cámaras pluviales, los cordones de hormigón, mosaico granítico y los bordillos en tres nuevas cuadras. También se realizó cableado para iluminación y la colocación de cestos, bancos y columnas en los sectores intervenidos. Comenzó el movimiento de suelo y adecuación de niveles en dos nuevos tramos. En lo que respecta a la obra hídrica, reemplazamos las cañerías de hormigón armado sobre calle Pavón.

A photograph of a construction site on a city street. Three workers in yellow safety vests and hard hats are visible. One worker is near a concrete mixer, another is near a stack of concrete slabs, and a third is further back. The ground is dirt and gravel. In the background, there are trees and a building with a sign that says 'TIENDA OFICIAL COLÓN'.

90%

de obra avanzada

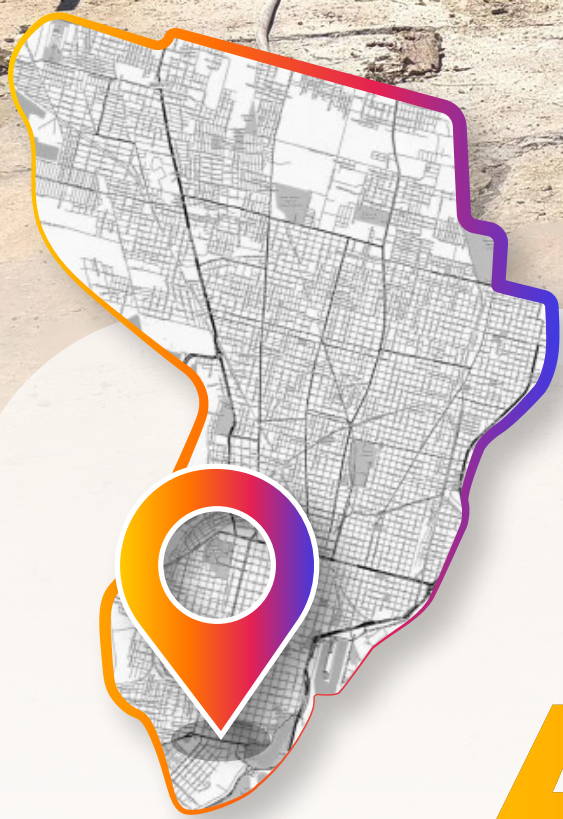


Cantero central de **Av. Juan José Paso**

Llevamos adelante la readecuación de bocas de tormenta, ejecución de rampas de accesibilidad, colocación de losetas y cestos de basura, mobiliario urbano, ciclistas y luminarias. Además, estamos forestando en todo el largo del cantero central.

Por otro lado, aguardamos la llegada de un caño para complementar los trabajos hídricos donde vamos a mejorar el drenaje del agua en los días de lluvia.

25%
de obra
avanzada

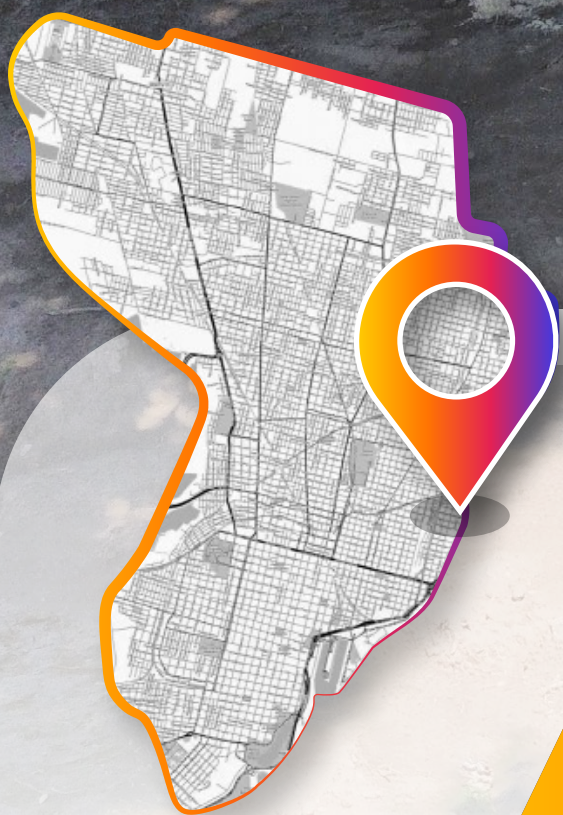


Cantero central de **Av. 7 Jefes**

Realizamos la colocación de mosaico y bordillos en la zona de Bv. Muttis y cámaras y caños eléctricos. Trasladamos tableros y comenzamos la colocación de columnas de alumbrado con su respectivo cableado eléctrico.

También, comenzamos la colocación de juegos infantiles, cestos, mobiliario urbano y limpieza para siembra de pasto en los espacios verdes.

54%
de obra
avanzada

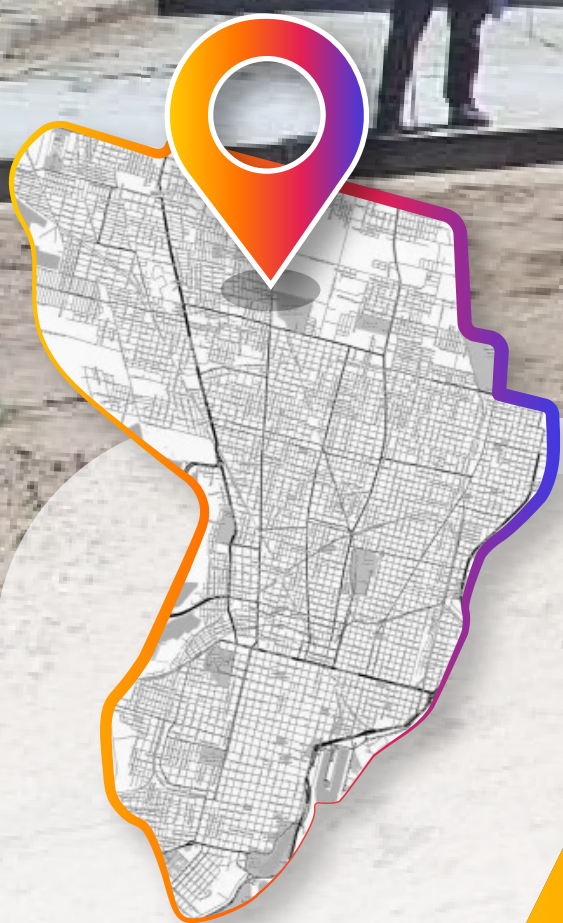

Pavimentación de **Av. Peñaloza**

Realizamos corrimientos y liberación de traza, la rotura y remoción de pavimentos existentes, y el movimiento de suelo para la preparación de la subrasante. Avanzamos con la colocación de la base RDC de 15 cm y el pavimento de hormigón de 18 cm, junto con la ejecución de una boca de tormenta y la colocación de una columna de acero tubular. Continuamos los trabajos de pavimento de hormigón, alumbrado público y cordones cuneta.









Santa Fe
PROVINCIA

**Ministerio de
Obras Públicas**
