PROYECTO: OBRA DESAGUE CANAL VIDELA **PLANILLA Nº 47**

SECCION TRANV. PROG. **10467.00**

SECCIÓN TRANSVERSAL PREVIA Y CON PROYECTO

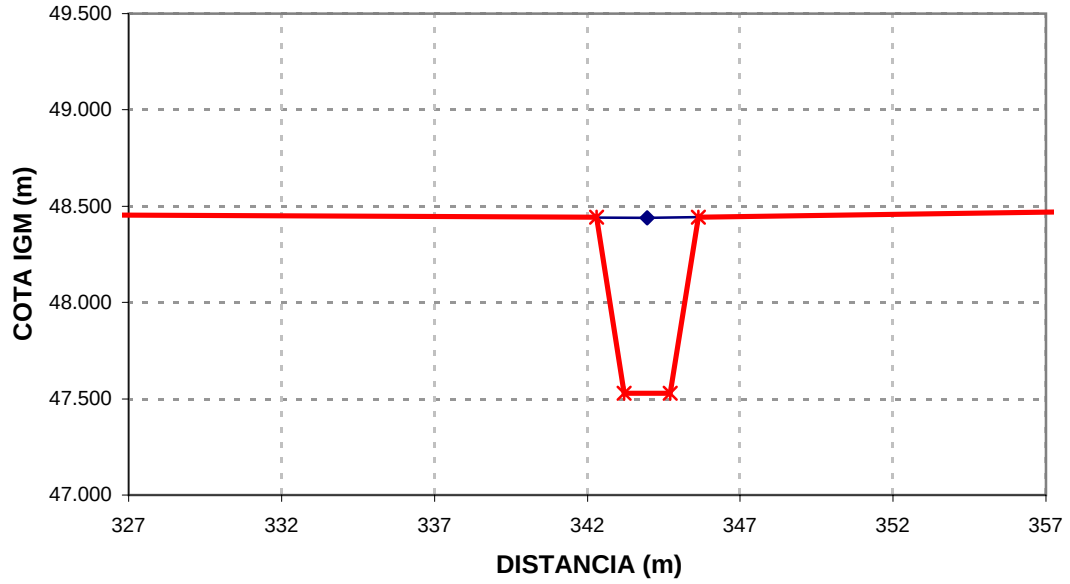

distancia previa	cota IGM previa	distancia c/proy.	cota IGM c/proy
0.00	49.610	0.00	49.610
276.25	48.490	276.25	48.490
343.96	48.440	342.30	48.441
400.27	48.570	343.21	47.530
464.77	48.670	344.71	47.530
529.57	48.770	345.62	48.444
538.27	48.760	400.27	48.570
550.97	48.840	464.77	48.670
633.18	48.780	529.57	48.770
		538.27	48.760
		550.97	48.840
		633.18	48.780

DATOS DE PROYECTO

ANCHO DE BASE	1.50
COTA DE RASANTE	47.53
TALUD IZQ.	1.00
TALUD DERECH.	1.00
POSICIÓN DEL CENTRO	343.96

AREA DE EXCAVACIÓN

AREA DE EXCAVACIÓN **2.20** **m2**
